

**XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO  
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"**

**PSSE 2001 – 2006**

**Programma Operativo  
Annuale 2003**

**Arch. Antonello M. Stefanini  
Dott.ssa Patrizia Di Fazio**

# PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE 2003

## INDICE:

- (1) Introduzione**
- (2) Considerazioni sull'attuazione del PSSE**
  - a) Ulteriori azioni e progettazioni dal Marzo 2002 al Marzo 2003
  - b) Considerazioni sull'attuazione del V° Piano Pluriennale di interventi
  - c) Considerazioni sull'attuazione del VI° Piano Pluriennale di interventi
  - d) Cronoprogramma delle iniziative in corso
- (3) Programma Operativo Annuale – POA 2003**
- (4) Schede dei progetti attivabili tramite il Fondo della montagna e fondo DLgs 504/92**
- (5) Schede dei progetti attivabili tramite Fondi propri**
- (6) Schede dei progetti a bando degli enti sovraordinati**
  - a) Progetti e candidature a bando avanzati alla Provincia
  - b) Progetti e candidature a bando avanzati alla Regione
  - c) Progetti e candidature a bando avanzati allo Stato
  - d) Progetti e candidature a bando avanzati alla Unione Europea
- (7) Modalità di attuazione, controllo e rendicontazione**
- (8) Cronoprogramma delle varie iniziative contenute nel POA**
- (9) Modalità di rimodulazione del POA**
- (10) Attuazione della carta di qualità:**
  - a) Aggiornamento delle Norme tecniche di Attuazione
  - b) Aggiornamento della modulistica
- (11) Quadro economico finanziario del POA 2003**

## INTRODUZIONE

Il Programma Operativo Annuale 2003 (POA 2003), si struttura sulla base di un insieme d'interventi che tengono conto innanzitutto dell'attuazione del Piano di Sviluppo Socio Economico della Comunità Montana 2001-2006, integrato con azioni, interventi ed iniziative progettuali avviate dalla Comunità Montana in quest'ultimo anno, che comprendono attività ritenute strategiche dall'Ente nell'immediato futuro.

Il presente Programma Operativo riguarda le attività e le opere che s'intendono svolgere, attivare e proseguire nel 2003, tenendo conto altresì che sono in fase di attuazione numerosi progetti strutturali già in cantiere da tempo, che prosegue l'attuazione del V° PPI (2001/2002) ed il VI° PPI (2002/2003), che sono state avanzate numerose candidature su bandi di Enti sovraordinati e che sono programmati interventi grazie al sostegno finanziario della CC.DD.PP..

Tra gli elementi primari che concorrono alla definizione del presente Programma Operativo assume notevole importanza il monitoraggio intermedio riferito all'attuazione generale del PSSE e di quella dei Piani Pluriennali avviati, per la valutazione dell'incidenza del lavoro svolto sulle dinamiche socio-economiche dell'area montana. L'analisi del lavoro svolto riguarda anche le attività dell'Agenzia di sensibilizzazione del territorio, il lavoro di informazione svolto per EE.PP. e privati – specie in relazione all'attivazione del Docup Ob. 2-, ma anche l'esame dei possibili miglioramenti in termini di rapporto con i cittadini, facilità di accesso alle informazioni ed ai fondi messi a disposizione dall'Ente montano.

Il Programma Operativo è qui volutamente inteso ed utilizzato quale strumento di valutazione ed analisi del lavoro svolto, per la ricognizione della molteplicità di azioni in corso, per la predisposizione di nuove iniziative, nonché per avanzare alcuni suggerimenti derivanti dall'esperienza di front-office offerta dall'Agenzia di Sviluppo della Comunità Montana, nel rapporto quotidiano con gli utenti. Esso costituisce inoltre integrazione della relazione al bilancio di previsione 2004 con riferimento a ciascuna azione.

Poiché il Piano di Sviluppo Socio Economico prevede, attraverso azioni coordinate, la partecipazione allo sviluppo dell'area degli EE.LL., dei privati e dei cittadini organizzati dell'area, attraverso la partecipazioni ad molte iniziative di sviluppo locale messe a bando dall'Ente Montano, nel capitolo finale trova posto una nuova versione delle Norme Tecniche per la realizzazione di opere da ammettersi a cofinanziamento, aggiornata e resa più chiara in relazione alle problematiche segnalate da progettisti e cittadini per la richiesta di co-finanziamento. Essa vuole rappresentare anche un documento unico, una **carta della qualità**, per i rapporti tra la Comunità Montana ed il territorio da applicarsi anche ai prossimi Programmi Operativi.


## CONSIDERAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEL PSSE (2001-2006)

Il Piano di Sviluppo Socio Economico rappresenta il documento programmatico in base al quale l'Ente ha orientato la gamma degli interventi attivati da 2000 ad oggi. L'insieme degli interventi attivati e realizzati rientra quindi all'interno di una visione strategica complessiva di sviluppo del comprensorio montano.

In particolare a partire dal 2001 si registra un notevole avanzamento del PSSE in quanto risultano essere state attivate risorse per Euro 8.744.650,00 su di un totale di Piano di Euro 27.372.000,00. L'attuazione quindi nel primo biennio è del 31,95 %.

Nel grafico seguente sono messi in relazione ed esplicitati gli importi delle azioni a seconda della tipologia del beneficiario (EE.PP. o privati) e vengono aggiunti gli importi della progettazione effettuata dall'Agenzia di cui si tratterà in seguito.

Va sottolineato che questa ultima, è in massima parte in via di valutazione da parte degli Enti sovraordinati, ma che i progetti riguardano attività aventi uno strettissimo rapporto con i cittadini, fatto di coinvolgimenti e di partecipazione (si pensi per esempio al Forum di Agenda 21 od al coinvolgimento delle Scuole nel progetto Life-Environment "Week&Waste"), pur essendo indicati come interventi per EE.PP. in quanto la Comunità Montana coordinerà i progetti, spesso in collaborazione con i comuni partner dell'area.

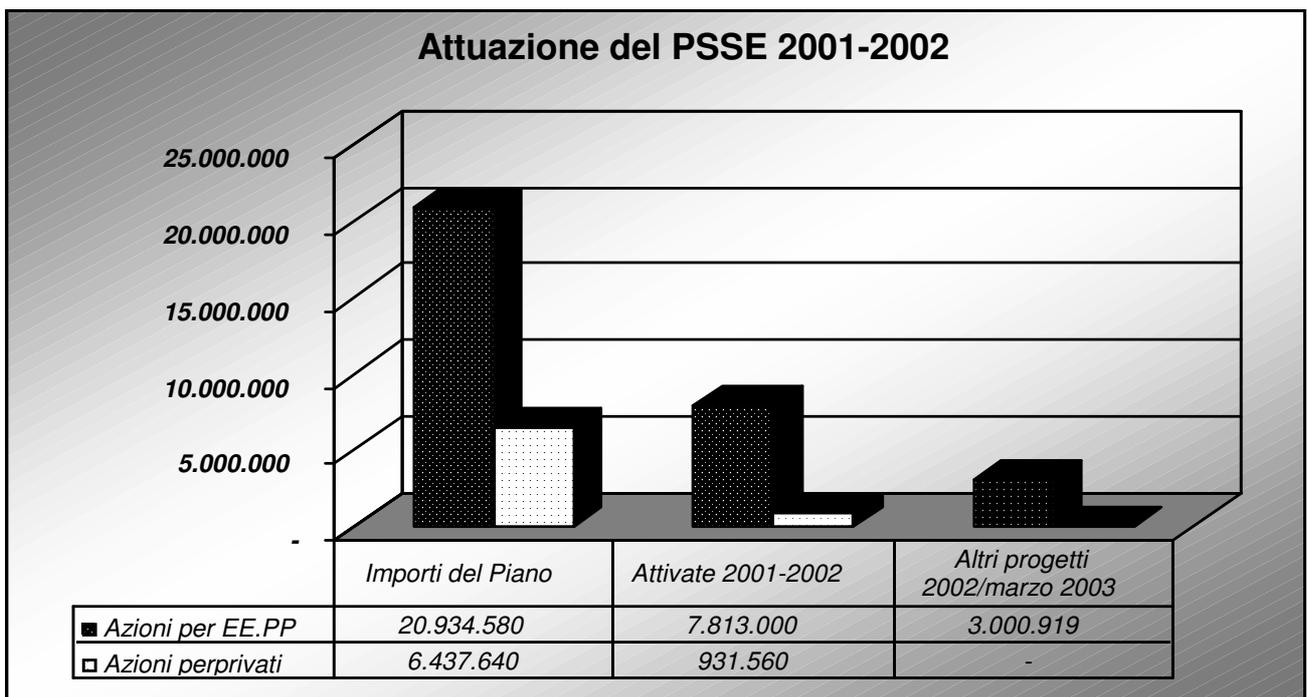

In generale nel primo biennio di attuazione le azioni del PSSE avviate per gli EE.PP. (Ente Montano compreso, ma escludendo i progetti richiesti a bando ad Enti sovraordinati in via di valutazione) rappresentano il 37,3 % dell'intero budget previsto nel Piano, mentre quelle avviate per i privati raggiungono il 14,5 %.

Mediamente quindi il Piano di Sviluppo Socio Economico è stato **attivato nelle annualità 2001 e 2002 per il 31,95%**. Poiché il PSSE si attua in 6 anni, ciò costituisce un'ottima performance attuativa, a dimostrazione della concretezza e

congruità del Piano in relazione alle dotazioni finanziarie disponibili ed in raffronto alla programmazione attivabile.

**ULTERIORI AZIONI E PROGETTAZIONI DAL MARZO 2002 AL MARZO 2003**

Per realizzare le azioni del Piano, oltre ad utilizzare i fondi propri, la Giunta, con la collaborazione dell'Agencia di Sviluppo si è quindi attivata per predisporre ed approvare una notevole serie di progettazioni, iniziative e candidature a valere sui vari bandi emessi dagli Enti sovraordinati come risulta dalle tabelle seguenti.

**Bandi Provinciali:**

<b>Tipo di iniziativa</b>	<b>Bando</b>	<b>Importo tot. del progetto</b>	<b>Di cui impegno C.M.</b>
Progetto intercultura (*)	Bando 001/2003	35.782	10.735
Progetto carta topografica "Trittico" (*)	Bando Det. Dirig. 84/03	8.640	3.456
Adeguamento sede della Comunità Montana (*)	Bando Prov. - Contributi EE.LL.	151.265	0
<b>A) TOTALE RICHIESTO PROVINCIA</b>		<b>195.687</b>	<b>14.191</b>

**Bandi e proposte su Leggi Regionali**

<b>Tipo di iniziativa</b>	<b>Bando</b>	<b>Importo tot. del progetto</b>	<b>Di cui impegno C.M.</b>
Prime azioni propedeutiche del Sistema Museale Territoriale (a)	Art. 34 Legge 9/99	160.315	0
Riconoscimento del Sistema Museale Territoriale (**a)	Legge 42/97	72.171	0
Sistema bibliotecario Prenestini (**a)	Legge 42/97	278.456	86.765 sul VI PPI
Sistema fieristico "Attraz. Castelli" (*)	Legge Reg.le 60/91	118.000	25.000
Promozione Offerta Turistica (*)	Docup Ob 2 Asse III Sott. III.2.3	125.000	0
Portale web di promozione turistica (*)	Docup Ob 2 Asse III Sott. III.2.3	553.428	0
Formazione Progetto EDA (*)	FSE Ob 3 Asse C Misura C4	256.787	0
Strada dei Vini (*)	PSR Misura 2.1 - P 1c	175.000	43.750
<b>B) TOTALE RICHIESTO REGIONE</b>		<b>1.739.157</b>	<b>68.750</b>

**Bandi Nazionali**

<b>Tipo di iniziativa</b>	<b>Bando</b>	<b>Importo tot. del progetto</b>	<b>Di cui impegno C.M.</b>
Attivazione di una Agenda 21 locale (*)	Bando Min. Ambiente	218.597	71.070
<b>C) TOTALE RICHIESTO STATO</b>		<b>218.597</b>	<b>71.070</b>

**Bandi Comunitari**

**Programma Operativo Annuale 2003**

<b>Tipo di iniziativa</b>	<b>Bando</b>	<b>Importo tot. del progetto</b>	<b>Di cui impegno C.M.</b>
Progetto Week&Waste (*)	Bando LIFE-AMBIENTE	1.254.370	122.625
Città Gemellate (**b)	Bando U.E. DG EAC	35.000	10.800
<b>D) TOTALE RICHIESTO UE</b>		<b>1.289.370</b>	<b>133.425</b>

Note

(a) approvato e finanziato per 128.765

(\*) Progetti in fase di valutazione

(\*\*a) Progetto presentato in data 30/0603

(\*\*b) Progetto in fase di predisposizione – scad. 17/07/03

La tabella che segue rappresenta dunque la sintesi del lavoro progettuale svolto principalmente dall’Agenzia in ordine alle richieste di fondi a vari Enti sovraordinati nel periodo **marzo 2002 – marzo 2003**

<b>PROGETTI</b>	<b>Importo tot. dei progetti presentati</b>	<b>Di cui impegno C.M.</b>	<b>Differenza (1)</b>	<b>Di cui già ottenuti</b>
<b>A) TOTALE RICHIESTO ALLA PROVINCIA</b>	<b>195.687</b>	<b>14.191</b>	<b>181.496</b>	<b>0</b>
<b>B) TOTALE RICHIESTO ALLA REGIONE</b>	<b>1.739.157</b>	<b>68.750</b>	<b>1.541.642</b>	<b>128.765 (2)</b>
<b>C) TOTALE RICHIESTO ALLO STATO</b>	<b>218.597</b>	<b>71.070</b>	<b>147.527</b>	<b>0</b>
<b>D) TOTALE RICHIESTO ALLA U.E.</b>	<b>1.289.370</b>	<b>133.425</b>	<b>1.155.945</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.442.811</b>	<b>287.436</b>	<b>3.026.609</b>	<b>128.765</b>

Note

(1) compresa, se prevista, una contribuzione dei partner del progetto

(2) prime azioni propedeutiche all’attivazione del Sistema Museale Territoriale

Parallelamente al lavoro di richiesta di fondi esterni per l’attuazione di interventi del PSSE, sono proseguite le azioni di attuazione del V° PPI e del VI° PPI, oltre al lavoro di animazione territoriale svolto per le imprese, i cittadini e le pubbliche Amministrazioni specie in occasione delle scadenze del Docup Obiettivo 2.

**CONSIDERAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEL V° PPI (2001/2002)**

I risultati intermedi evidenziano come le azioni inserite nei Piani Pluriennali d'Intervento a favore dei privati, hanno avuto un buon successo specie per quello che concerne la riqualificazione dei centri storici mediante il recupero delle facciate.

Sempre per il settore privato, di scarsa rilevanza sono risultate le azioni in favore delle botteghe artigiane, sia per la quantità di richieste sia per le tipologie d'intervento proposte dai richiedenti.

Nel settore dei richiedenti pubblici (comprese le Istituzioni Scolastiche), il V PPI ha avuto molto successo in quanto sono pervenuti progetti in numero superiore alle disponibilità, cui si è fatto fronte con fondi non utilizzati in altre misure del Piano. Anche la partecipazione delle Istituzioni scolastiche è stata superiore alle disponibilità, cui l'Ente ha fatto fronte mediante minori utilizzi di altre iniziative.

La proposta dell'attivazione del Consorzio forestale, pur recependo un notevole interesse iniziale, non ha avuto seguito operativo, per cui occorre ripensarne l'attuazione.

Il Piano si prevede possa trovare ultimazione entro la fine del 2003, con esclusione della rimodulazione dell'azione sul Consorzio Forestale, e comunque entro il giugno 2004.

**CONSIDERAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEL VI° PPI (2002/2003)**

I bandi attivati sono suddivisi in due fasi temporali.

Nella prima fase sono stati emessi (Agosto 2002) due bandi -Youth e Comenius- accompagnati da alcune azioni di informazione mediante manifesti, riunioni ed e-mail ai potenziali soggetti beneficiari.

A tutt'oggi risultano pervenuti 3 richieste sul bando Comenius e nessuna richiesta sul bando Youth.

Nella seconda fase (gennaio 2003) sono stati emessi ulteriori 3 bandi con scadenza il 29 maggio 2003, per cui si resta in attesa delle domande di cofinanziamento.

E' in corso la redazione del progetto esecutivo l'iniziativa sul Tuscolo, il cui bando prevede l'affidamento di opere e della gestione del sito archeologico per 10 anni.

Per quanto attiene alle azioni d'attuazione diretta da parte della Comunità Montana, si registra la necessità di accelerarne l'esecuzione.

Il Piano si prevede possa trovare ultimazione alla fine del 2004.

Si raccomanda di effettuare ulteriori azioni di sensibilizzazione dei beneficiari delle azioni Youth e Comenius, magari offrendo un aiuto diretto da parte dell'Agenzia, specie per il bando Youth. Si suggerisce di prorogare la scadenza dei bandi Youth e Comenius fino al Dicembre 2003, ed in caso di mancato utilizzo di fondi di procedere alla rimodulazione.

**Indicatori di realizzazione del V° e del VI° PPI al 30/05/03**

V PPI:

- Progetti previsti: 43
- Progetti pervenuti: 65

- Progetti co-finanziati: 51


VI PPI:

- Bandi attivati: 5 (di cui due aperti a tutto il 31/07/03)
- Progetti previsti: 16
- Progetti presentati: 29
- Progetto co-finanziati: 3 (al 30/05/03)

(è in corso la valutazione su 26 progetti presentati a fine maggio su 3 bandi)

Residui I e III PPI:

- (b) Bandi attivati: 3 (con scadenza luglio e agosto '03)

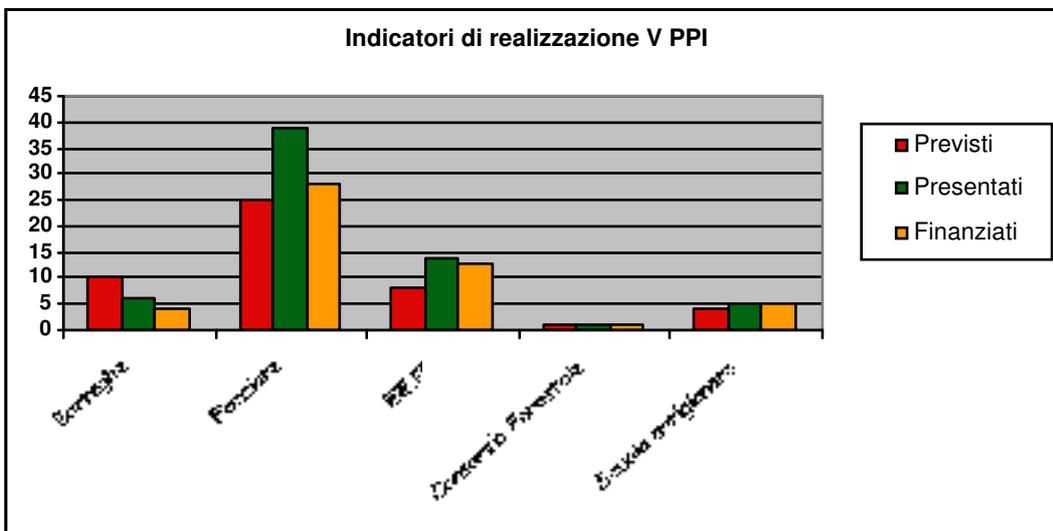

**ALTRI FONDI RESIDUI SUL I° E III° PPI**

L'Ente montano sta utilizzando fondi residui su precedenti PPI, utilizzando la metodologia attuativa della messa a bando di fondi, senza variare la destinazione dei fondi stessi.

Si tratta di interventi per la trasformazione di castagneti (da cedui a produttivi di marroni e castagne) e di interventi per la messa a dimora di piante officinali.

**CRONOPROGRAMMA DELLE VARIE INIZIATIVE IN CORSO**

Dall'analisi della tempistica delle varie iniziative scaturisce l'articolazione temporale attuativa dei vari documenti programmatici annuali secondo la seguente tabella:

<b>Attività</b>	<b>Tempistica</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>20 04</b>		<b>2005</b>
				<b>1° sem.</b>	<b>2° sem.</b>	<b>1° sem.</b>
V° PPI						
VI° PPI						
Residui PPI pregressi						

## PROGRAMMA OPERATIVO 2003

Gli interventi del POA 2003 continuano l'attuazione del PSSE, tenendo conto delle considerazioni svolte precedentemente sulla sua attuazione, tenendo conto della necessità di implementare le azioni rivolte al settore privato per recuperarne il peso percentuale sui dati attuativi.

Nell'individuazione degli interventi si sono tenuti conto da un lato la coerenza con le finalità e gli obiettivi del PSSE e dall'altro della volontà dell'Ente di operare per un concreto sviluppo locale.

Di seguito vengono suddivisi gli interventi a valere sulla tipologia di fondo e vengono presentate schede specifiche per ciascuna attività.

### Provenienza dei fondi

I fondi per l'attuazione del POA 2003 risultano dalla seguente tabella:

Tipologia di fondo	Stato dei fondi	Importo	TOTALI
Fondo nazionale della montagna (annualità 2000 e residui 1996)	Assegnati	333.795,00	
Fondo Dlgs 504/92 (annualità 2002)	Assegnati	53.178,08	
<b>Sub totale</b>			<b>386.973,08</b>
Fondi propri	Assegnati	164.141	<b>164.141,00</b>
Fondi attivabili sui progetti dei bandi provinciali	Richiesti su bandi	181.497	
Fondi attivabili sui progetti dei bandi regionali (1)	Richiesti su bandi	1.147.465	
Fondi attivabili sui progetti dei bandi nazionali	Richiesti su bandi	218.597	
Fondi attivabili sui progetti dei bandi U.E.	Richiesti su bandi	1.289.370	
<b>Sub totale</b>			<b>2.836.929,00</b>
Fondi attivabili mediante ricorso alla CC.DD.PP.	Da richiedere	250.000	<b>250.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE POA 2003 (2)</b>			<b>3.638.043,08</b>

(1) in corso di redazione le richieste su Sistema Museale territoriale e Sistema Bibliotecario Prenestini

(2) esclusi gli importi a carico dei beneficiari

L'articolazione degli interventi per tipologia di fondo è la seguente:

#### **Interventi previsti sul fondo della montagna e sul Dlgs 504/92**

- Azioni innovative cooperative sociali
- Recupero facciate nei centri storici
- Turismo scolastico (archeologico/museale) interno alla Comunità Montana (scuole materne, elementari, medie)
- Valorizzazioni produzioni e prodotti locali nelle botteghe e nei ristoranti
- Materiale informativo e Gestione del Piano

#### **Interventi previsti con fondi propri**

- Patente Europea per l'utilizzo del Computer (ECDL)
- Corso sommelier
- Progetti pilota relativi ai "Centri commerciali naturali"

- Adesione Consorzio Sviluppo Industriale
- Marketing museale a target sull'utenza scolastica Romana
- Animazione e Coordinamento Sistema Museale Territoriale
- Gestione delle azioni

**Altri interventi mediante risposta a bandi e candidature**

- 13), 14) e 15) Progetti sui bandi provinciali
- 16), 17), 18), 19), 20), 21) e 22) Progetti sui bandi regionali
- 23) Progetto sui bandi nazionali
- 24) e 25) Progetti sui bandi comunitari
- 26) Progetto attivabile tramite il ricorso alla CC.DD.PP.

Per ogni intervento seguono delle **schede specifiche** che approfondiscono gli aspetti e le caratteristiche peculiari di ciascuno.

Per gli **interventi attivabili con il fondo della montagna, con i fondi Dlgs 504/92 e con i fondi propri (dal n° 1 al n° 12)**, vengono dettagliate le seguenti caratteristiche:

- Descrizione dell'opera/azione
- Finalità
- Risultati attesi
- Tipologia di opera;
- Azione di riferimento del PSSE;
- Modalità d'attuazione
- Area territoriale di riferimento
- Cofinanziamento previsto a carico dell'Ente montano, importo totale dell'azione e della singola iniziativa od opera, n° di interventi previsti, e durata max della realizzazione;
- Indicatori di realizzazione
- Risorse umane per l'attuazione e per il controllo

Per gli altri **interventi/progetti in risposta a bandi mediante candidatura (dal n° 13 al n° 26)** vengono esplicitate le seguenti caratteristiche:

- Ente a cui è stata avanzata candidatura e riferimento legislativo o di bando
- Descrizione dell'opera/azione
- Finalità
- Risultati attesi
- Status della candidatura
- Tipologia di opera;
- Azione di riferimento del PSSE
- Modalità d'attuazione
- Area territoriale di riferimento
- Cofinanziamento previsto a carico dell'Ente montano, Cofinanziamento totale, Cofinanziamento di eventuali partner, n° di sotto-azioni previste nel progetto e durata max. della realizzazione
- Indicatori di realizzazione
- Risorse umane per l'attuazione e per il controllo

**P.O.A. 2003**

**SCHEDE DEI PROGETTI  
PREVISTI SUL  
FONDO DELLA MONTAGNA  
E SUL DLGS 504/92**

**Intervento n° 1 – Azioni innovative cooperative sociali**

**Descrizione dell'opera/azione:** L'azione prevede di co-finanziare azioni innovative di cooperative sociali /associazioni/centri sociali/centri anziani operanti nel terzo settore, per progetti pilota di sostegno ed assistenza alle fasce deboli della popolazione (anziani, disabili, disoccupati, ex detenuti, famiglie extracomunitarie etc), che possano essere estesi lungo l'arco di un anno.

**Finalità:** La finalità è quella di sperimentare progetti pilota di sostegno che possano poi essere autonomamente proseguiti a partire dal 2° anno, grazie al sostegno delle Amministrazioni locali.

**Risultati attesi:** 2 progetti pilota con forte carattere innovativo

<b>Parametro</b>	<b>Caratteristiche</b>
Tipologia di opera/azione	Immateriale per Associazioni operanti nel 3° settore
Azione di riferimento del PSSE	2.2.b
Modalità d'attuazione	Bando di evidenza pubblica
Area territoriale di riferimento	Territorio della Comunità Montana
Cofinanziamento a carico dell'Ente montano	80 %
Cofinanziamento del Beneficiario	10%
Importo totale dell'azione	22.500
Importo di progetto/opera/iniziativa	11.250
N° di interventi previsti	2
Durata massima interventi (dalla data di bando)	14 mesi
Indicatori di realizzazione	2 progetti pilota
Risorse umane per attuazione	Associazioni beneficiarie
Risorse umane per controllo	Agenzia di Sviluppo

## Intervento n° 2 – Recupero facciate nei centri storici

**Descrizione dell'opera/azione:** Si tratta di co-finanziare il rifacimento di facciate di edifici privati situati nei centri storici. Nel precedente V PPI questa misura ha avuto un notevole successo con 28 interventi co-finanziati (molti già ultimati e liquidati). In questa riproposizione si cercherà di premiare quegli edifici costituenti un ambito urbano (un intero tratto di una strada o parte di una piazza), oppure edifici contigui che effettuano interventi contemporaneamente, in modo da incidere sulle quinte urbane.

**Finalità:** Miglioramento dell'immagine dei centri storici, spinta alle Amministrazioni locali a dotarsi di Piani colore o Piani di recupero dei centri storici.

**Risultati attesi:** almeno 32 facciate ristrutturate. La consistenza del patrimonio edilizio dei centri storici dell'area (edifici pluripiano, ma di modesta altezza complessiva) consentirà presumibilmente di co-finanziare un numero maggiore di facciate poiché, come già sperimentato, non tutti i richiedenti si attesteranno sul limite massimo di 25.000 Euro/progetto.

Parametro	Caratteristiche
Tipologia di opera/azione	Materiale per privati
Azione di riferimento del PSSE	2.3.a
Modalità d'attuazione	Bando di evidenza pubblica
Area territoriale di riferimento	Territorio della Comunità Montana
Cofinanziamento a carico dell'Ente montano	35 %
Cofinanziamento del Beneficiario	65%
Importo totale dell'azione	800.000
Importo di progetto/opera/iniziativa	25.000
N° di interventi previsti	32
Durata massima interventi (dalla data di bando)	12 mesi
Indicatori di realizzazione	32 facciate ristrutturate
Risorse umane per attuazione	Privati beneficiari
Risorse umane per controllo	Agenzia di Sviluppo

**Intervento n° 3 – Turismo archeologico e museale scolastico interno al territorio della XI Comunità Montana**

**Descrizione dell'opera/azione:** si tratta di incentivare il turismo scolastico interno al territorio della Comunità Montana per la promozione delle emergenze culturali dell'area, con particolare riferimento ai siti archeologici ed ai musei dell'area. L'azione è connessa con quelle distinte con i nn° 10, 11, 17 e 26.

**Finalità:** conoscenza, diffusione ed informazione sul patrimonio archeologico e museale locale da parte degli alunni e dei genitori. L'azione costituisce inoltre un'ulteriore spinta alle Amministrazioni Comunali - dotate di un museo- per l'apertura sistematica al pubblico.

**Risultati attesi:** 28 visite territoriali in musei e aree archeologiche dell'area montana, organizzate dalle Istituzioni Scolastiche, cui partecipino anche i genitori.

<b>Parametro</b>	<b>Caratteristiche</b>
Tipologia di opera/azione	Immateriale per le Istituzioni Scolastiche
Azione di riferimento del PSSE	2.3.c
Modalità d'attuazione	Bando di evidenza pubblica
Area territoriale di riferimento	Territorio della Comunità Montana
Cofinanziamento a carico dell'Ente montano	90 %
Cofinanziamento del Beneficiario	10%
Importo totale dell'azione	21.000
Importo di progetto/opera/iniziativa	1.500
N° di interventi previsti	14
Durata massima interventi (dalla data di bando)	12 mesi
Indicatori di realizzazione	26 visite territoriali di alunni e genitori
Risorse umane per attuazione	Istituti Scolastici beneficiari
Risorse umane per controllo	Agenzia di Sviluppo

#### **Intervento n° 4 – Valorizzazione delle produzioni locali nelle botteghe e nei ristoranti**

**Descrizione dell'opera/azione:** Accanto alla produzione del vino, sono presenti nel territorio della XI Comunità Montana, una molteplicità di produzioni tipiche locali (dal "tordo matto" al pane, dai biscotti al miele, dalle produzioni di frutta biologica agli insaccati) ed una discreta varietà di ricette tipiche locali.

La Comunità Montana fa parte del Comitato promotore della Strada dei Vini dei Castelli Romani che prevede anche la valorizzazione di altri prodotti locali ed ha già finanziato ad esempio la realizzazione di un ricettario di piatti tipici locali, ma occorre promuovere questa valorizzazione dei prodotti nei punti maggiormente frequentati dai visitatori del week-end.

Per questo l'azione prevede di co-finanziare attività di cornering dei prodotti locali presso botteghe tipiche e ristoranti.

Saranno privilegiati quei progetti che prevedano per i ristoratori l'impegno a mantenere per un anno almeno 4 piatti tipici locali nei menù, accompagnandoli con almeno 7 tipi di vini dell'area -DOC e di qualità- provenienti da cantine diverse.

Per le botteghe saranno premiati quei commercianti che ospiteranno un punto di cornering e di degustazione dei prodotti tipici, vino compreso.

Si darà preferenza a quegli operatori che fanno parte ed aderiscono alla Strada dei Vini dei Castelli Romani, strada in via di riconoscimento da parte della Regione Lazio.

L'azione è connessa con gli interventi n° 7 (Corso per sommelier) e con quello distinto con il n° 22 (strada dei Vini dei Castelli Romani).

**Finalità:** Valorizzazione delle produzioni tipiche, delle ricette tradizionali, dei prodotti biologici

**Risultati attesi:** attivazione di 26 punti di cornering tra botteghe e ristoratori.

<b>Parametro</b>	<b>Caratteristiche</b>
Tipologia di opera/azione	Immateriale
Azione di riferimento del PSSE	3.3.a
Modalità d'attuazione	Bando di evidenza pubblica
Area territoriale di riferimento	Territorio della Comunità Montana
Cofinanziamento a carico dell'Ente montano	35 %
Cofinanziamento del Beneficiario	65 %
Importo totale dell'azione	78.000
Importo di progetto/opera/iniziativa	3.000
N° di interventi previsti	26
Durata massima interventi (dalla data di bando)	12 mesi
Indicatori di realizzazione	26 punti cornering prodotti locali
Risorse umane per attuazione	Beneficiari operatori del settore
Risorse umane per controllo	Agenzia di Sviluppo

Note: L'iniziativa utilizzerà i loghi ed il marchio della Strada dei Vini dei Castelli Romani, unitamente a quello della Comunità Montana.

**Intervento n° 5 – Materiale informativo e Gestione del piano**

**Descrizione dell'opera/azione:** Come previsto dal PSSE i piani annuali si attuano attraverso l'Agenzia di Sviluppo dell'Ente Montano.

Il ruolo dell'Agenzia della XI Comunità Montana consiste, anche per i suddetti interventi, nello svolgere azioni di animazione territoriale, redazione dei bandi e dei capitolati per gli affidamenti, monitoraggio, controllo sulla realizzazione delle opere, controllo delle somme ammesse a rendicontazione. Eventuale rimodulazione dei fondi non assegnati.

Trovano copertura nel presente intervento le azioni di progettazione delle azioni (Euro 10.000) nonché tutte le attività per la gestione dei vari interventi.

E' inoltre prevista una spesa di 10.000 Euro per spese di realizzazione di materiale divulgativo, sui bandi e sulle iniziative nonché per l'inserimento nelle pagine WEB dei bandi e dei principali progetti.

**Finalità:** Gestione delle attività necessarie alla realizzazione, controllo e rendicontazione delle iniziative.

**Risultati attesi:** Redazione di 4 bandi (azioni 1, 2, 3, 4), monitoraggio di attuazione, controlli sulla realizzazione di oltre 74 progetti.

<b>Parametro</b>	<b>Caratteristiche</b>
Tipologia di opera/azione	Immateriale
Azione di riferimento del PSSE	3.1.a
Modalità d'attuazione	Diretta
Area territoriale di riferimento	Territorio della Comunità Montana
Cofinanziamento a carico dell'Ente montano	100
Cofinanziamento del Beneficiario	0
Importo totale dell'azione	42.773,00
Importo di progetto/opera/iniziativa	-
N° di interventi previsti	Gestione dei bandi e rendicontaz.
Durata massima interventi (dalla data di bando)	16 mesi
Indicatori di realizzazione	74 progetti/azioni ultimati/e
Risorse umane per attuazione	Agenzia di Sviluppo
Risorse umane per controllo	Segreteria Generale dell'ente

**P.O.A. 2003**

**SCHEDE DEI PROGETTI  
PREVISTI CON FONDI PROPRI**

**Intervento n° 6 – ECDL – Sostegno alla popolazione locale ed ai giovani per il conseguimento della “patente europea per il computer”**

**Descrizione dell’opera/azione:** L’intervento prevede di co-finanziare a 55 corsisti la partecipazione ai corsi per il conseguimento della patente europea per il computer sui 7 moduli previsti. I beneficiari saranno divisi in due categorie: junior (a cui verranno riservati il 70% dei posti) e senior. Le lezioni saranno tenute nell’area montana da EE.PP. od istituti privati che abbiano ottenuto il riconoscimento per svolgere tali attività. Resteranno a carico dei soggetti beneficiari i costi per la skill-card e per sostenere gli esami.

**Finalità:** Il progetto prevede il miglioramento delle competenze di base in tema di nuove tecnologie

**Risultati attesi:** almeno 40 patenti ECDL

<b>Parametro</b>	<b>Caratteristiche</b>
Tipologia di opera/azione	Immateriale
Azione di riferimento del PSSE	2.2.a
Modalità d’attuazione	Bando di evidenza pubblica
Area territoriale di riferimento	Territorio della Comunità Montana
Cofinanziamento a carico dell’Ente montano	40 %
Cofinanziamento del Beneficiario	60 %
Importo totale dell’azione	35.750
Importo di progetto/opera/iniziativa	650
N° di interventi previsti	90 partecipanti
Durata massima interventi (dalla data di bando)	8 mesi
Indicatori di realizzazione	40 patenti ECDL sui 7 moduli
Risorse umane per attuazione	Collaborazione esterna organismo di formazione riconosciuto, beneficiari corsisti
Risorse umane per controllo	Agenzia di Sviluppo

Note: il bando prevederà delle forme cautelative per evitare costi a carico dell’ente in caso d’abbandono del corsista.

**Intervento n° 7 – Corso per sommelier**

**Descrizione dell'opera/azione:** L'azione di proporre di co-finanziare, nella formazione per sommelier, 30 giovani (max. 40 anni) in cerca di prima occupazione. Detto corso sarà organizzato e tenuto in uno dei 13 Comuni della Comunità Montana. L'intervento è connesso con quelli distinto al n° 4 (Valorizzazione delle produzioni e dei prodotti locali nelle botteghe e nei ristoranti), e con il n° 22 (Strada dei vini).

**Finalità:** Poiché il territorio è interessato da una notevole presenza di produzioni vinicole, e considerato che la Comunità Montana ha attivato una serie di azioni per la valorizzazione delle produzioni locali (partecipazione al Comitato promotore della Strada dei Vini, intervento a valere sul PSR per la tabellonistica del circuito, azioni di sostegno alle produzioni tipiche locali e biologiche) si intende proseguire attivando questa azione per la formazione di personale che potrà operare in contatto con i produttori, i commercianti, i ristoratori e le cantine sociali.

**Risultati attesi:** Formazione di 30 sommelier. S'intende affidare all'Associazione Italiana Sommelier la realizzazione di un corso annuale di specializzazione nel settore, individuando i 30 partecipanti mediante bando di evidenza pubblica.

<b>Parametro</b>	<b>Caratteristiche</b>
Tipologia di opera/azione	Immateriale per giovani
Azione di riferimento del PSSE	2.2.b
Modalità d'attuazione	Bando di evidenza pubblica per individuazione corsisti
Area territoriale di riferimento	Territorio della Comunità Montana
Cofinanziamento a carico dell'Ente montano	35%
Cofinanziamento del Beneficiario	65%
Importo totale dell'azione	60.000
Importo di progetto/opera/iniziativa	2.000 /cad
N° di interventi previsti	30
Durata massima interventi (dalla data di bando)	12 mesi
Indicatori di realizzazione	30 attestati di partecipazione
Risorse umane per attuazione	Associazione Italiana Sommelier
Risorse umane per controllo	Agenzia di Sviluppo

**Intervento n° 8 – Progetti pilota sui “Centri Commerciali Naturali”**

**Descrizione dell’opera/azione:** L’iniziativa prevede di cofinanziare attività di valorizzazione alcune aree dei centri storici in cui vi sia la presenza di un sistema diffuso di piccole botteghe e negozi. Essa è rivolta agli EE.PP. ed alle Associazioni dei Commercianti locali, che dovranno unirsi per la presentazione di un progetto di valorizzazione che contenga sia interventi materiali che immateriali. L’Ente montano co-finanzierà le iniziative private contenute nel progetto al 40% ed all’80% quelle di competenza dell’Ente pubblico locale fino ad un massimo di 15.000 Euro per progetto.

**Finalità:** La finalità è quella di supportare le piccole attività commerciali nella loro diversificazione, nel miglioramento dell’offerta e dell’intorno urbano, al fine di attrarre clientela e di contribuire ad un’offerta commerciale di qualità.

**Risultati attesi:** 2 progetti pilota misti (EE.PP. locale ed Associazione dei Commercianti) per il miglioramento di un ambito urbano a presenza commerciale.

<b>Parametro</b>	<b>Caratteristiche</b>
Tipologia di opera/azione	Materiale/Immateriale
Azione di riferimento del PSSE	3.2.a
Modalità d’attuazione	Bando di evidenza pubblica
Area territoriale di riferimento	Territorio della Comunità Montana
Cofinanziamento a carico dell’Ente montano	40% Priv. - 80% EE.PP.
Cofinanziamento del Beneficiario	60% Priv. - 20% EE.PP.
Importo totale dell’azione	50.000
Importo di progetto/opera/iniziativa	25.000 /cad
N° di interventi previsti	2
Durata massima interventi (dalla data di bando)	10 mesi
Indicatori di realizzazione	2 iniziative pilota realizzate
Risorse umane per attuazione	Beneficiari misti
Risorse umane per controllo	Agenzia di Sviluppo

**Intervento n° 9 – Adesione al Consorzio di Sviluppo Industriale Roma Latina**

**Descrizione dell'opera/azione:** è prevista l'adesione al Consorzio Area Sviluppo Industriale ASI Roma Latina. Detta adesione dell'Ente Montano proietterà gli operatori locali in una situazione già consolidata ed altamente operativa dal punto di vista delle dimensioni consortili, dell'esperienza e professionalità e dei servizi offerti.

**Finalità:** Il Consorzio ASI si pone quale interfaccia operativa e dialettica con le forze politiche e sociali con funzioni di sviluppo dei propri soci per ogni tipo di servizio che riguarda lo sviluppo produttivo, artigianale ed industriale.

**Risultati attesi:** Attivazione di uno sportello di assistenza tecnica per le imprese presso la sede dell'ente montano con frequenza settimanale.

<b>Parametro</b>	<b>Caratteristiche</b>
Tipologia di opera/azione	Immateriale /Azione di sistema
Azione di riferimento del PSSE	3.1.b
Modalità d'attuazione	Azione svolta direttamente dall'Ente montano
Area territoriale di riferimento	Territorio della Comunità Montana
Cofinanziamento a carico dell'Ente montano	100 %
Cofinanziamento del Beneficiario	0
Importo totale dell'azione	10.000
Importo di progetto/opera/iniziativa	10.000
N° di interventi previsti	1
Durata massima interventi (dalla data di bando)	12 mesi
Indicatori di realizzazione	Adesione e apertura sportello per imprese
Risorse umane per attuazione	Consorzio Industriale
Risorse umane per controllo	Segreteria generale dell'Ente

**Intervento n° 10 – Marketing museale dell’utenza scolastica romana**

**Descrizione dell’opera/azione:** Il nostro territorio ha un immenso potenziale bacino d’utenza costituito dalla popolazione della città di Roma e dalla sua area metropolitana. Si procederà ad un affidamento diretto per la costruzione operativa e pratica di una serie di pacchetti di visita per le Scuole dell’area romana, con particolare riferimento al Sistema Museale Territoriale. Detti pacchetti saranno poi presentati ai vari insegnanti per la promozione dell’offerta di visita.

**Finalità:** Conoscenza, divulgazione ed informazione sul patrimonio architettonico, archeologico e museale dell’area montana. L’azione inoltre è connessa con quella della valorizzazione delle produzioni locali nelle botteghe e nei ristoranti.

**Risultati attesi:** Costruzione di almeno 3 tipologie di pacchetti (scuola elementare, media e liceo) specifici, in due tipologie di visita (mezza giornata o giornata intera)

<b>Parametro</b>	<b>Caratteristiche</b>
Tipologia di opera/azione	Immateriale /azione di sistema
Azione di riferimento del PSSE	2.3.b
Modalità d’attuazione	Affidamento diretto
Area territoriale di riferimento	Territorio della Comunità Montana
Cofinanziamento a carico dell’Ente montano	100 %
Cofinanziamento del Beneficiario	0
Importo totale dell’azione	35.000
Importo di progetto/opera/iniziativa	35.000
N° di interventi previsti	1
Durata massima interventi (dalla data di bando)	12 mesi
Indicatori di realizzazione	2000 contatti, realizzaz. pacchetti
Risorse umane per attuazione	Affidatario esterno
Risorse umane per controllo	Agenzia di Sviluppo

Note: Per l’affidamento diretto è prevista la redazione da parte dell’Agenzia di un Capitolato prestazionale, da sottoporre alla Giunta per l’approvazione.

**Intervento n° 11 – Animazione e Coordinamento Sistema Museale Territoriale Castelli Romani e Prenestini**

**Descrizione dell'opera/azione:** La Comunità Montana sta avviando il Sistema Museale Territoriale – SMT - Castelli Romani e Prenestini. La prima azione del Sistema è quella della redazione del progetto di riconoscimento da avanzare alla Regione Lazio che comprenda almeno 4 o 5 musei di EE.LL. e le relative spese tecniche. Il progetto prevede anche delle azioni di coordinamento delle attività, organizzazione, segreteria tecnica e monitoraggio delle attività dell'organismo tecnico di gestione del Sistema.

**Finalità:** Dotare il costituendo Sistema Museale Territoriale Castelli Romani e Prenestini di un supporto tecnico ed organizzativo

**Risultati attesi:** Presentazione del progetto di riconoscimento, attività di organizzazione, segreteria e monitoraggio.

<b>Parametro</b>	<b>Caratteristiche</b>
Tipologia di opera/azione	Immateriale /azione di sistema
Azione di riferimento del PSSE	2.3.a
Modalità d'attuazione	Attuazione diretta
Area territoriale di riferimento	Territorio della Comunità Montana
Cofinanziamento a carico dell'Ente montano	100 %
Cofinanziamento del Beneficiario	0
Importo totale dell'azione	30.000
Importo di progetto/opera/iniziativa	30.000
N° di interventi previsti	1
Durata massima interventi (dalla data di bando)	12 mesi
Indicatori di realizzazione	Progetto di riconoscimento + prime azioni immateriali
Risorse umane per attuazione	Agenzia di Sviluppo + incaricati
Risorse umane per controllo	Segreteria Generale dell'Ente

**Intervento n° 12 – Gestione delle azioni con fondi propri**

**Descrizione dell'opera/azione:** Come previsto dal PSSE i piani annuali, nonché le azioni attivabili mediante fondi propri previste si attuano attraverso l'Agenzia di Sviluppo dell'Ente Montano.

Il ruolo dell'Agenzia della XI Comunità Montana consiste, anche per i suddetti interventi, nello svolgere azioni di animazione territoriale, redazione dei bandi e dei capitolati per gli affidamenti, monitoraggio, controllo delle opere, controllo delle somme ammesse a rendicontazione. Eventuale rimodulazione dei fondi non assegnati. Trovano copertura nel presente intervento le azioni di progettazione degli interventi (Euro 2.565) nonché tutte le attività per la gestione dei vari interventi (10.000 Euro). E' inoltre prevista una spesa di 2.000 Euro per spese di realizzazione di materiale divulgativo, sui bandi e sulle iniziative nonché per l'inserimento nelle pagine WEB dei bandi e dei principali progetti.

**Finalità:** Gestione delle attività necessarie alla realizzazione, controllo e rendicontazione delle iniziative.

**Risultati attesi:** Redazione di 3 bandi (azioni 6, 7,8) realizzazione di un Capitolato di oneri (azione 10), attività di segreteria tecnica per il SMT, monitoraggio di attuazione controllo di realizzazione di oltre 88 progetti/iniziative.

<b>Parametro</b>	<b>Caratteristiche</b>
Tipologia di opera/azione	Immateriale
Azione di riferimento del PSSE	3.1.a
Modalità d'attuazione	Diretta
Area territoriale di riferimento	Territorio della Comunità Montana
Cofinanziamento a carico dell'Ente montano	100
Cofinanziamento del Beneficiario	0
Importo totale dell'azione	14.546,00
Importo di progetto/opera/iniziativa	-
N° di interventi previsti	Gestione dei bandi e rendicontaz.
Durata massima interventi (dalla data di bando)	12 mesi
Indicatori di realizzazione	88 progetti/azioni ultimati/e
Risorse umane per attuazione	Agenzia di Sviluppo
Risorse umane per controllo	Segreteria Generale dell'Ente

# **P.O.A. 2003**

## **SCHEDE DEI PROGETTI A CANDIDATURA**

**fondi a bando dalla Provincia, Regione, Stato, U.E.,  
progetti realizzati col sostegno della CC.DD.PP.**

L'attività dell'Ente non si è limitata alla gestione dei fondi disponibili e pertanto vengono qui analizzate le ulteriori azioni che presumibilmente si realizzeranno a partire dal 2003, in caso di ottenimento del co-finanziamento da parte degli Enti sovraordinati, che troveranno attuazione negli anni immediatamente successivi, secondo il calendario attuativo previsto in ciascun progetto.

Essi seguono il seguente ordine:

- **Progetti e candidature a bando avanzati alla Provincia**
- **Progetti e candidature a bando avanzati alla Regione**
- **Progetti e candidature a bando avanzati allo Stato**
- **Progetti e candidature a bando avanzati alla Unione Europea**
- **Progetti da realizzare con il sostegno della CC.DD.PP.**

**Intervento n° 13 – Progetto intercultura ed assistenza partecipata**

Ente sovraordinato a cui è stata avanzata candidatura: **Provincia di Roma**  
 Servizio Info e Comunicaz.  
 Istituzionale -  
 Bando 001/2003

**Descrizione dell'opera/azione:** Il progetto è collegato con l'iniziativa distinta al n° 17 e prevede di supportare con l'utilizzo di tecnologie informatizzate e multimediali la messa in rete di un sistema di educazione permanente degli adulti. Verranno acquistate attrezzature informatiche per i seminari itineranti, verrà realizzato un forum telematico sulle pagine web dell'Ente, con relative azioni di sensibilizzazione del territorio e degli addetti.

**Finalità:** Supporto e monitoraggio del progetto n° 17 EDA riguardante l'educazione degli adulti; miglioramento delle azioni della Comunità Montana per l'educazione permanente delle fasce deboli.

**Risultati attesi:** messa in rete degli attori sociali impegnati nel settore.

Status della candidatura al 30 maggio '03: **in corso di valutazione**

<b>Parametro</b>	<b>Caratteristiche</b>
Tipologia di opera/azione	immateriale
Azione di riferimento del PSSE	2.2.c
Modalità d'attuazione	Diretta + subforniture
Area territoriale di riferimento	Territorio della Comunità Montana
Importo totale richiesto	35.782
Cofinanziamento a carico dell'Ente montano	30% - 10.735
Cofinanziamento dell'Ente sovraordinato	70% - 25.047
Cofinanz. di eventuali partner del progetto	0
N° di sotto azioni previste nel progetto	3
Durata massima interventi (dalla data di concessione dei cofinanziamenti)	5 mesi
Indicatori di realizzazione	Acquisto dotazioni informatiche, consulenze per gestione Forum, realizzazione di un forum
Risorse umane per attuazione	Subforniture+ incarico esterno + Agenzia di Sviluppo
Risorse umane per controllo	Agenzia di Sviluppo

**Intervento n° 14 – Progetto carta topografica “Trittico”**

Ente sovraordinato a cui è stata avanzata candidatura: **Provincia di Roma**  
 Dip. IV – Servizio Turismo  
 Bando Det. Dirig. 84/03

**Descrizione dell’opera/azione:** Il progetto prevede la realizzazione di materiale promozionale attraverso la realizzazione di una carta topografica del territorio della Comunità Montana contenente le principali infrastrutture ed emergenze di interesse turistico.

**Finalità:** Strumento per la visita del territorio: supporto al visitatore per la visita e conoscenza del territorio

**Risultati attesi:** Maggiore diffusione della conoscenza del territorio a fini turistici

Status della candidatura al 30 maggio '03: **in corso di valutazione**

<b>Parametro</b>	<b>Caratteristiche</b>
Tipologia di opera/azione	immateriale
Azione di riferimento del PSSE	3.2.b
Modalità d’attuazione	Diretta + subforniture
Area territoriale di riferimento	Territorio della Comunità Montana
Importo totale richiesto	8.640
Cofinanziamento a carico dell’Ente montano	40% - 3.456
Cofinanziamento dell’Ente sovraordinato	60% - 5.184
Cofinanziam. di eventuali partner del progetto	0
N° di sotto azioni previste nel progetto	2
Durata massima interventi (dalla data di concessione dei cofinanziamenti)	5 mesi
Indicatori di realizzazione	6.000 carte topografiche
Risorse umane per attuazione	Agenzia di Sviluppo
Risorse umane per controllo	Segreteria Generale dell’Ente

**Intervento n° 15 – Adeguamento sede della Comunità Montana**

Ente sovraordinato a cui è stata avanzata candidatura: **Provincia di Roma**  
 Servizio Informazione  
 Comunicazione Istituzionale  
 Contributi agli EE.LL.  
 "Tipologia B del bando"

**Descrizione dell'opera/azione:** L'opera prevede la ristrutturazione dell'area circostante la sede dell'Ente con la realizzazione di posti auto e la sistemazione del garage per la rimessa dei mezzi di proprietà dell'Ente.

**Finalità:** Migliorare la fruibilità degli spazi esterni della sede dell'Ente

**Risultati attesi:** Sistemazione area esterna, creazione di n.8 posti auto, adeguamento interno garage.

Status dell'azione al 30 maggio '03:

**in corso di valutazione**

<b>Parametro</b>	<b>Caratteristiche</b>
Tipologia di opera/azione	Materiale
Azione di riferimento del PSSE	1.2.a
Modalità d'attuazione	Diretta
Area territoriale di riferimento	Territorio della Comunità Montana
Importo totale previsto	151.265,24
Cofinanziamento a carico dell'Ente montano	10% - 15.126,52
Cofinanziamento dell'Ente sovraordinato	90%- 136.138,72
Cofinanziam. di eventuali partner del progetto	0
N° di sotto azioni previste nel progetto	1
Durata massima interventi (dalla data di concessione dei cofinanziamenti)	8 mesi
Indicatori di realizzazione	Creazione posti auto, sistemazione garage
Risorse umane per attuazione	Ufficio Tecnico
Risorse umane per controllo	Segreteria Generale dell'Ente

**Intervento n° 16 – Sistema Fieristico “Attrazione Castelli”**

Ente sovraordinato a cui è stata avanzata candidatura: **Regione Lazio**  
Legge Regionale 60/91

**Descrizione dell’opera/azione:** Intervento a sostegno della promozione turistica del territorio regionale attraverso la FORNITURA DI SERVIZI promopubblicitari, ufficio stampa, servizi di traduzione, in occasione delle manifestazioni fieristiche che si svolgono nel territorio delle XI Comunità montana.

Coordinamento dell’attività convegnistica legata a ciascuna iniziativa fieristica, organizzazione accoglienza ed assistenza delegazioni partner.

Guida turistica enogastronomica, ricettiva, storico-artistica ed archeologica su supporto cartaceo ed informatico, calendario eventi.

**Finalità:** scopo del progetto è quello di supportare gli EE.LL., attraverso attività diverse, nella gestione delle fiere locali, prevedendo di fornire supporti specialistici agli espositori nonché di promuovere a livello comprensoriale l’insieme delle diverse manifestazioni fieristiche.

**Risultati attesi:** assistenza agli EE.PP. in 4 manifestazioni

Status della candidatura al 30 maggio ‘03: **in corso di valutazione**

<b>Parametro</b>	<b>Caratteristiche</b>
Tipologia di opera/azione	immateriale
Azione di riferimento del PSSE	3.1.b
Modalità d’attuazione	Diretta + subforniture
Area territoriale di riferimento	Territorio della Comunità Montana
Importo totale richiesto	118.000
Cofinanziamento a carico dell’Ente montano	21,19 % - 25.000
Cofinanziamento dell’Ente sovraordinato	68,64% - 81.000
Cofinanziam. di eventuali partner del progetto	10,17% - 12.000
N° di sotto azioni previste nel progetto	5 - 4
Durata massima interventi (dalla data di concessione dei cofinanziamenti)	12 mesi
Indicatori di realizzazione	Organizzazione eventi, cartoguida turistica, servizi di assistenza agli EE.PP.
Risorse umane per attuazione	Agenzia di Sviluppo
Risorse umane per controllo	Segreteria Generale dell’Ente

**Intervento n° 17 – Riconoscimento e prime azioni del Sistema Museale Territoriale Castelli Romani e Prenestini**

Ente sovraordinato a cui sarà avanzata candidatura: **Regione Lazio**  
Legge 42/97

**Descrizione dell'opera/azione:** L'azione ha già visto l'approvazione di un primo progetto di azioni propedeutiche alla creazione di un sistema museale territoriale di importo totale di 160.315 Euro a valere sull'art. 34 della Legge 9/99 (cofinanziamento della Regione pari a 125.686 Euro). Esso prevede alcune iniziative integrate costituite da: riunioni ed incontri per la costituzione del Sistema, stesura ed approvazione di uno Statuto del sistema, messa a bando di risorse per la realizzazione di opere e per l'effettuazione di operazioni di catalogazione nei musei, individuazione del marchio del Sistema, realizzazione di primo materiale pubblicitario e di cartellonistica stradale, sensibilizzazione degli insegnanti locali, ampliamento del sito web dell'Ente. Nella fase attuale (SCADENZA 30/06/03) si richiede alla Regione il riconoscimento del Sistema e fondi per la realizzazione dei primi interventi di sistema.

**Finalità:** Ottenimento del riconoscimento del Sistema Museale Territoriale denominato Castelli Romani e Prenestini. L'azione ha evidenti collegamenti con le azioni n° 4 e 6 del POA.

**Risultati attesi:** Candidatura (deadline 30 giugno) per il riconoscimento del Sistema, Riconoscimento del Sistema Museale Territoriale da parte della Regione Lazio completamento di almeno 4 Musei secondo le caratteristiche del Piano Settoriale Regionale, individuazione del marchio, sensibilizzazione degli insegnanti locali

Status della candidatura al 30 giugno '03: **presentato fascicolo candidatura**

<b>Parametro</b>	<b>Caratteristiche</b>
Tipologia di opera/azione	Immateriale / Azione di sistema
Azione di riferimento del PSSE	2.3.a
Modalità d'attuazione	Diretta + bandi + subforniture
Area territoriale di riferimento	Comuni della Comunità Montana aderenti al Sistema Museale Territoriale
Importo totale richiesto	72.170,60
Cofinanziamento a carico dell'Ente montano	7.2017,06
Cofinanziamento dell'Ente sovraordinato	65.043,54
Cofinanziam. di eventuali partner del progetto	0
N° di sotto azioni previste nel progetto	4
Durata massima interventi (dalla data di concessione dei cofinanziamenti)	12 mesi
Indicatori di realizzazione	Ottenimento del riconoscimento regionale di SMT, Realizzazione come da progetto
Risorse umane per attuazione	Incaricati + Agenzia di Sviluppo
Risorse umane per controllo	Segreteria generale dell'Ente

**Intervento n° 18 – Sistema Bibliotecario Monti Prenestini**

Ente sovraordinato a cui è stata avanzata candidatura: **Regione Lazio**  
 Legge 42/97  
 Candidatura in preparazione

**Descrizione dell'opera/azione:** L'azione prosegue l'intervento del VI PPI dedicato alla messa in rete delle biblioteche Comunali dei 6 Comuni dell'area prenestina. Questo intervento si propone di effettuare la catalogazione dei volumi delle biblioteche, azioni di promozione del Sistema, azioni di sensibilizzazione e coordinamento dei servizi culturali e bibliotecari.

**Finalità:** Miglioramento dei servizi culturali, promozione alla lettura, completamento della messa in rete delle biblioteche

**Risultati attesi:** catalogazione del 65% del patrimonio di volumi delle 6 biblioteche

Status della candidatura al 30 giugno '03: **presentato fascicolo candidatura**

<b>Parametro</b>	<b>Caratteristiche</b>
Tipologia di opera/azione	Immateriale / Azione di sistema
Azione di riferimento del PSSE	2.1.a
Modalità d'attuazione	Diretta con subforniture
Area territoriale di riferimento	Cave, Genazzano, Galliciano nel Lazio, Palestrina, S. Cesareo, Zagarolo
Importo totale richiesto	278.455,94
Cofinanziamento a carico dell'Ente montano	86.764,75
Cofinanziamento dell'Ente sovraordinato	170.000,00
Cofinanziam. di eventuali partner del progetto	21.691,19
N° di sotto azioni previste nel progetto	6
Durata massima interventi (dalla data di concessione dei cofinanziamenti)	15 mesi
Indicatori di realizzazione	Catalogazione, seminari, materiale promozionale.
Risorse umane per attuazione	Incaricato
Risorse umane per controllo	Segreteria generale dell'Ente

**Intervento n° 19 – Promozione dell’offerta turistica**

Ente sovraordinato a cui è stata avanzata candidatura: **Regione Lazio**  
 Docup ob 2  
 Asse III – sott. III.2.3

**Descrizione dell’opera/azione:** L’azione prevede la realizzazione di materiale divulgativo cartaceo (nonché in sunto su ulteriori pagine web dell’Ente) di 5 tipologie di visita e di circuito (sentieri e mountain-bike, circuito dei musei, circuito delle biblioteche, circuito dei siti archeologici, circuito delle Ville Storiche e dei Palazzi). L’azione ha connessioni con le azioni relative alla Strada dei Vini: intervento n° 18.

**Finalità:** Diversificazione dell’offerta turistica mediante la predisposizione di circuiti di visita a tema. L’azione ha collegamenti evidenti con quelle distinte con i nn° 4, 6, 7, 13, 14, 16, 18, 24.

**Risultati attesi:** Ulteriore materiale divulgativo a disposizione dell’utente anche su web

Status della candidatura al 30 maggio '03: **in corso di valutazione**

<b>Parametro</b>	<b>Caratteristiche</b>
Tipologia di opera/azione	Immateriale
Azione di riferimento del PSSE	2.3.a
Modalità d’attuazione	Diretta + subforniture
Area territoriale di riferimento	Territorio della Comunità Montana
Importo totale richiesto	125.000
Cofinanziamento a carico dell’Ente montano	0%
Cofinanziamento dell’Ente sovraordinato	100%
Cofinanziam. di eventuali partner del progetto	0
N° di sotto azioni previste nel progetto	4
Durata massima interventi (dalla data di concessione dei cofinanziamenti)	12 mesi
Indicatori di realizzazione	Mappa territoriale, 125.000 depliant, un educational per 10 op. turistici, 8 incontri sensibilizzazione, integrazione sito web
Risorse umane per attuazione	Subforniture
Risorse umane per controllo	Agenzia di Sviluppo

**Intervento n° 20 – Portale Web per la Promozione Turistica**

Ente sovraordinato a cui è stata avanzata candidatura: **Regione Lazio**  
 Docup ob 2 Asse III  
 Sott. III.2.2

**Descrizione dell'opera/azione:** Realizzazione di un sistema multimediale per la promozione turistica, culturale ed economica del territorio. L'azione è propedeutica alla costituzione del Sistema Turistico Locale.

**Finalità:** Conoscenza del territorio attraverso strumenti di innovazione tecnologica finalizzati alla valorizzazione e promozione turistica

**Risultati attesi:** visita virtuale al territorio della XI Comunità Montana + eventuali applicazioni (prodotti di promozione, CD interattivi, pubblicazioni su WEB)

Status della candidatura al 30 maggio '03: **in corso di valutazione**

<b>Parametro</b>	<b>Caratteristiche</b>
Tipologia di opera/azione	immateriale
Azione di riferimento del PSSE	2.3.b
Modalità d'attuazione	Diretta + subforniture
Area territoriale di riferimento	Territorio della Comunità Montana
Importo totale richiesto	553.428
Cofinanziamento a carico dell'Ente montano	0%
Cofinanziamento dell'Ente sovraordinato	100%
Cofinanziam. di eventuali partner del progetto	0
N° di sotto azioni previste nel progetto	1
Durata massima interventi (dalla data di concessione dei cofinanziamenti)	36 mesi
Indicatori di realizzazione	Aggiornamento delle pagine web con sezione specifica
Risorse umane per attuazione	Incarico esterno + subforniture
Risorse umane per controllo	Agenzia di Sviluppo

**Intervento n° 21 – Formazione “ Progetto EDA”**

Ente sovraordinato a cui è stata avanzata candidatura: **Regione Lazio**  
 FSE – obiettivo 3  
 Misura C 4

**Descrizione dell’opera/azione:** Progetto integrato comprendente 3 azioni di sistema (ricerca sull’offerta formativa per l’educazione permanente degli adulti, centro di ascolto ed orientamento per operatori addetti al sostegno alle fasce deboli, seminari culturali per formatori di operatori e di adulti di fascia debole)

**Finalità:** Miglioramento delle competenze di base, diffusione dell’importanza del ruolo sull’educazione permanente degli adulti.

**Risultati attesi:** miglioramento delle azioni dell’Ente verso le fasce deboli

Status della candidatura al 30 maggio '03: **in corso di valutazione**

<b>Parametro</b>	<b>Caratteristiche</b>
Tipologia di opera/azione	Immateriale
Azione di riferimento del PSSE	2.2.a
Modalità d’attuazione	Diretta + subforniture
Area territoriale di riferimento	Territorio della Comunità Montana
Importo totale richiesto	265.787
Cofinanziamento a carico dell’Ente montano	0%
Cofinanziamento dell’Ente sovraordinato	100%
Cofinanziam. di eventuali partner del progetto	0
N° di sotto azioni previste nel progetto	3
Durata massima interventi (dalla data di concessione dei cofinanziamenti)	12 mesi
Indicatori di realizzazione	Opuscolo, questionari, centro di ascolto, 40 seminari di un giorno/cad
Risorse umane per attuazione	Incarico esterno
Risorse umane per controllo	Agenzia di Sviluppo

**Intervento n° 22 – Strada dei Vini dei Castelli Romani**

Ente sovraordinato a cui è stata avanzata candidatura: **Regione Lazio**  
 Piano di Sviluppo Rurale-PSR  
 Misura II.1 – Az. P 1 c

**Descrizione dell'opera/azione:** L'azione prevede di installare ulteriore cartellonistica stradale lungo il percorso della Strada dei Vini (in fase di attivazione e di cui la Comunità Montana fa parte nel comitato promotore), secondo la linea grafica e di immagine già individuata e di installare totem della strada presso botteghe e ristoranti aderenti alla Strada. E' già stata richiesta agli operatori privati interessati la disponibilità ad ospitare i totem e si sono avute oltre 15 adesioni. Alcuni totem verranno installati presso i Comuni.  
 L'azione è stata concordata in fase di progettazione con il Comitato Promotore della Strada.

**Finalità:** Attivazione delle Strada dei Vini, diversificazione ed attrezzatura dell'offerta turistica. L'azione ha correlazione con l'intervento n° 7

**Risultati attesi:** installazione di cartelli stradali e di totem per aumentare la visibilità della Strada dei Vini dei Castelli Romani

Status della candidatura al 30 maggio '03: **in corso di valutazione**

<b>Parametro</b>	<b>Caratteristiche</b>
Tipologia di opera/azione	Materiale ed Immateriale
Azione di riferimento del PSSE	3.2.b
Modalità d'attuazione	Diretta + subforniture
Area territoriale di riferimento	Territorio della Comunità Montana
Importo totale richiesto	175.000
Cofinanziamento a carico dell'Ente montano	25% - 43.750
Cofinanziamento dell'Ente sovraordinato	75% - 131.250
Cofinanziam. di eventuali partner del progetto	0
N° di sotto azioni previste nel progetto	2
Durata massima interventi (dalla data di concessione dei cofinanziamenti)	12 mesi
Indicatori di realizzazione	50 Cartelli stradali e 20 totem
Risorse umane per attuazione	Agenzia di Sviluppo
Risorse umane per controllo	Segreteria generale dell'Ente

**Intervento n° 23 – Attivazione di una Agenda 21 locale**

Ente sovraordinato a cui è stata avanzata candidatura: **Stato Italiano**  
**Ministero dell’Ambiente**  
 Bando per Agende 21 Locali

**Descrizione dell’opera/azione:** Il progetto prevede di attivare una Agenda 21 Locale nel territorio della XI Comunità Montana. Partner del progetto sono tutte le Amministrazioni Comunali, l’ARPA Lazio, l’Associazione Industriali di Roma, CGIL, CISL e UIL. Sono previste azioni di sensibilizzazione della popolazione locale, attivazione di forum (anche informatico) e la redazione della relazione sullo stato dell’ambiente.

**Finalità:** La finalità principale, dato il carattere del PSSE dell’Ente, è quella di confrontare con la popolazione, con i portatori di interessi (stakeholders) e con le Amministrazioni, per un completo processo di bottom-up le azioni della Comunità Montana, non solo in tema di protezione ambientale ma anche nel settore della qualità della vita e dei servizi. Al termine del processo è prevista una rimodulazione del PSSE che tenga conto delle risultanze dei lavori.

**Risultati attesi:** Realizzazione di 13 incontri itineranti, realizzazione di 3 forum, un forum telematico, Relazione sullo stato dell’Ambiente

Status della candidatura al 30 maggio '03: **in corso di valutazione**

<b>Parametro</b>	<b>Caratteristiche</b>
Tipologia di opera/azione	Immateriale
Azione di riferimento del PSSE	1.3.a
Modalità d’attuazione	Diretta assieme ai partner + subforniture
Area territoriale di riferimento	Territorio della Comunità Montana
Importo totale richiesto	218.597
Cofinanziamento a carico dell’Ente montano	32,51% - 71.070
Cofinanziamento dell’Ente sovraordinato	67,49% - 147.527
Cofinanziam. di eventuali partner del progetto	Pur non essendo previsto cofinanziamento, i partner partecipano mettendo a disposizione proprio personale dipendente per il progetto
N° di sotto azioni previste nel progetto	3
Durata massima interventi (dalla data di concessione dei cofinanziamenti)	18 mesi
Indicatori di realizzazione	Sensibilizzazione, Forum, Relazione sullo stato dell’ambiente
Risorse umane per attuazione	Subforniture + Agenzia di Sviluppo
Risorse umane per controllo	Segreteria generale dell’Ente

L’Ente sta operando per l’attivazione del Forum telematico sul sito web. (pagine in costruzione).

**Intervento n° 24 – “Week&Waste” – (Rifiuti da Week-end)**

Ente sovraordinato a cui è stata avanzata candidatura: **Commissione Europea**  
**D.G. EAC** –Bando  
 Life-Environment 2002

**Descrizione dell’opera/azione:** Si tratta di azioni di sensibilizzazione della popolazione e degli utenti del territorio (specie nei gg festivi), di monitoraggio ed analisi dei rifiuti, di individuazione dei punti sensibili e di azioni di prevenzione per la riduzione dell’abbandono dei rifiuti.

**Finalità:** Il progetto prevede di sperimentare una metodologia per la riduzione ed il trattamento dei rifiuti nelle aree sensibili del territorio, fortemente soggette a turismo giornaliero. Sono partner del progetto le 13 Amministrazioni Comunali della Comunità Montana, L’ARPA Lazio, le società GAIA, ASP CIAMPINO e CEP.

**Risultati attesi:**

Status della candidatura al 30 maggio '03: **in corso di valutazione c/o la DG EAC superata l’analisi del Min. Ambiente**

<b>Parametro</b>	<b>Caratteristiche</b>
Tipologia di opera/azione	Immateriale
Azione di riferimento del PSSE	1.1.c
Modalità d’attuazione	Diretta assieme ai partner + subforniture
Area territoriale di riferimento	Territorio della Comunità Montana
Importo totale richiesto	1.254.370
Cofinanziamento a carico dell’Ente montano	9,78% - 122.625
Cofinanziamento dell’Ente sovraordinato	50 % - 627.185
Cofinanziam. di eventuali partner del progetto	40,22% - 504.560
N° di sotto azioni previste nel progetto	5
Durata massima interventi (dalla data di concessione dei cofinanziamenti)	24 mesi
Indicatori di realizzazione	Vedi progetto
Risorse umane per attuazione	Agenzia di Sviluppo + personale dell’ARPA Lazio, dei 13 Comuni, delle 3 società partner
Risorse umane per controllo	Segreteria generale dell’Ente

**Intervento n° 25 – Attivazione di una rete di Città Gemellate**

Ente sovraordinato a cui sarà avanzata candidatura: sarà avanzata alla **U.E.**  
**D.G. EAC**  
 Bando Gemellaggi

**Descrizione dell'opera/azione:** Invito ai partner gemellati dei comuni della Comunità montana ed ai responsabili dei gemellaggi locali, ad un primo incontro nell'area montana per lo scambio di esperienze sulle attività di gemellaggio e sui progetti transnazionali, nonché per promuovere i gemellaggi dei comuni dell'area che ne sono sprovvisti.

**Finalità:** Istituire un tavolo permanente tra i Comuni dell'area e tutti i Comuni gemellati con il territorio montano, al fine di promuovere la qualità delle attività di gemellaggio, la ricerca partner per i vari progetti transnazionali messi a bando dalla Commissione Europea.

**Risultati attesi:** Effettuazione della prima conferenza Internazionale delle Città Gemellate, prosecuzione di contatti per partnership sui progetti transnazionali U.E, prosecuzione del progetto con realizzazione di conferenze itineranti presso i vari paesi.

Status della candidatura al 30 maggio '03: **l'invio della candidatura è previsto entro il 17/07/2003**

<b>Parametro</b>	<b>Caratteristiche</b>
Tipologia di opera/azione	Immateriale
Azione di riferimento del PSSE	2.2.c
Modalità d'attuazione	Diretta + subforniture
Area territoriale di riferimento	Territorio della Comunità Montana
Importo totale previsto	35.000
Cofinanziamento a carico dell'Ente montano	30,85% - 10.800
Cofinanziamento dell'Ente sovraordinato	50% - 17.500
Cofinanziam. di eventuali partner del progetto	19,15 %- 6.700
N° di sotto azioni previste nel progetto	1
Durata massima interventi (dalla data di concessione dei cofinanziamenti)	12 mesi
Indicatori di realizzazione	Realizzazione della conferenza
Risorse umane per attuazione	Agenzia di Sviluppo + responsabili dei gemellaggi dei Comuni
Risorse umane per controllo	Segreteria generale dell'Ente

**Intervento n° 26 – Opere materiali del Sistema Museale territoriale**

Ente sovraordinato a cui sarà avanzata candidatura: **CC.DD.PP.**

**Descrizione dell'opera/azione:** Si tratta, ad integrazione delle azioni sull'offerta museale dell'area, di favorire la maggiore partecipazione possibile di Musei degli Enti Locali ricadenti entro il territorio dell'Ente Montano. La richiesta di candidatura alla Regione si basa infatti sulla presenza di 5 musei che rispettano il Piano settoriale regionale. Con la presente azione si intende aiutare gli altri Comuni che hanno aderito al Sistema, ma che hanno strutture museali inadeguate, nella realizzazione di opere, impianti e dotazioni che consentano loro di rispettare i parametri per l'inserimento nell'Organizzazione Museale Regionale e nel Sistema Museale Territoriale Castelli Romani e Prenestini. L'azione è connessa con le azioni n° 3, 10, 11 e 17.

**Finalità:** Ampliare l'offerta museale del Sistema Museale Territoriale Castelli Romani e prenestini

**Risultati attesi:** In relazione ai parametri richiesti dalla CC.DD.PP., si intende raccogliere i progetti esecutivi di sistemazione dei Musei dei vari EE.LL. unificarli in un unico appalto e provvedere alla loro realizzazione; per questo motivo non possono essere in questa fase quantificati gli interventi. In una prima fase verranno richieste tramite bando le progettazioni esecutive, poi redatto un unico progetto e successivamente appaltato.

Status della candidatura al 30 maggio '03: **l'invio della candidatura è previsto entro il 31/01/2004**

<b>Parametro</b>	<b>Caratteristiche</b>
Tipologia di opera/azione	Immateriale
Azione di riferimento del PSSE	2.2.c
Modalità d'attuazione	Diretta + subforniture
Area territoriale di riferimento	Territorio della Comunità Montana
Importo totale previsto	250.000 (stima di max.)
Cofinanziamento a carico dell'Ente montano	0
Cofinanziamento dell'Ente sovraordinato	100%
Cofinanziam. di eventuali partner del progetto	0
N° di sotto azioni previste nel progetto	Da definire
Durata massima interventi (dalla data di concessione dei cofinanziamenti)	18 mesi
Indicatori di realizzazione	Da definire
Risorse umane per attuazione	Agenzia di Sviluppo + tecnici incaricati dai Comuni
Risorse umane per controllo	Segreteria generale dell'Ente + uff. tecnico

**Modalità di attuazione, controllo e rendicontazione**

Secondo una modalità che sta dando buoni frutti, l'attuazione del Programma Operativo 2003 seguirà le stesse procedure in vigore dall'adozione del PSSE.

Si tratta di una stretta collaborazione tra la Giunta Esecutiva, la Segreteria generale, l'ufficio Tecnico e l'Agenzia di Sviluppo.

In buona sostanza la ripartizione del lavoro discende innanzitutto dalla tipologia del lavoro da affrontare, dalle competenze e dalle funzioni assegnate a ciascuno.

In generale, dopo l'intervento decisionale, si innescano varie fasi cui sovrintende la Segreteria Generale.

Il lavoro di predisposizione dei bandi, animazione territoriale, analisi dei progetti pervenuti nonché quello del rilascio dei pareri sulle liquidazioni, viene svolto dall'Agenzia (2 senior + uno junior).

La fase di controllo di attuazione dei progetti materiali viene svolta insieme dall'Ufficio Tecnico dell'Ente e da un addetto dell'Agenzia (architetto).

La fase di liquidazione dei co-finanziamenti viene svolta dalla Segreteria Generale e dall'ufficio ragioneria.

Ne risulta una rapidità attuativa notevole, essendo in grado il team di sottoporre alla giunta valutazioni pressoché settimanali e, per fornire un altro dato, le liquidazioni avvengono entro 2 settimane dalla visita ispettiva finale su di un intervento materiale (ad esempio una facciata).

Il lavoro viene organizzato mediante la predisposizione di stampati e di circolari che vengono allegati alla convenzione di co-finanziamento, in modo da costituire punti certi per il beneficiario privato.

Per quanto riguarda le azioni immateriali, il processo risulta addirittura più spedito in quanto a molte delle attività previste e co-finanziate vengono invitati i membri della Comunità Montana e dell'Agenzia e si hanno diretti riscontri sulle attività svolte. In questi casi spesso la liquidazione del co-finanziamento al soggetto privato avviene entro una settimana dalla presentazione della rendicontazione.

Senza volerci dilungare troppo, i bandi hanno la caratteristica di indicare chiaramente il tipo di progetto, il suo importo massimo, le percentuali a carico del beneficiario e quelle a carico dell'ente, la scadenza del bando e la durata dell'opera, le tipologie d'interventi ammissibili ed i criteri e punteggi che si utilizzeranno per la formazione delle graduatorie.

Per quanto riguarda le procedure di affidamento diretto il coordinamento e l'attuazione sono curati dalla Segreteria Generale e dall'Ufficio Tecnico se del caso.

**Cronoprogramma delle varie iniziative del POA 2003**

**Cronoprogramma del POA 2003**

*Fatta salva la tempistica di approvazione del POA della Regionale Lazio ed ipotizzando che essa possa collocarsi entro il 30 sett. 2003*

**Opere ed iniziative realizzate con fondi della montagna e fondi Dgls 504/92**

Attività /Tempi	3° trim. 2003	4° trim. 2003	1° trim. 2004	2° trim. 2004	3° trim. 2004	4° trim. 2004	1° trim. 2005	2° trim. 2005
Predisposizione bandi (1)								
Pubblicazione bandi								
Analisi progetti e convenzioni								
Realizzazione opere								
Controlli, rendicontazione beneficiari								
Rendicontazione alla Regione Lazio								

**Opere ed iniziative realizzate con fondi propri**

Attività /Tempi	3° trim. 2003	4° trim. 2003	1° trim. 2004	2° trim. 2004	3° trim. 2004	4° trim. 2004	1° trim. 2005	2° trim. 2005
Predisposizione bandi (1)								
Pubblicazione bandi								
Analisi progetti e convenzioni								
Realizzazione opere								
Controlli, rendicontazione beneficiari								
Rendicontazione alla Regione Lazio								

**Opere ed iniziative da realizzarsi tramite ricorso alla CC.DD.PP.**

Attività /Tempi	3° trim. 2003	4° trim. 2003	1° trim. 2004	2° trim. 2004	3° trim. 2004	4° trim. 2004	1° trim. 2005	2° trim. 2005
Predisposizione e pubblicaz. bandi (2)								
Fine elaborazione progetti esecutivi								
Concessione finanziamento CC.DD.PP			31/03					
Gare di appalto ed aggiudicazione								
Realizzazione opere								
Controlli, collaudi								
Rendicontazione alla CC.DD.PP.								

Note:

(1) riferita alle azioni 1,2,3,4,6,7,8

(2) riferita all'azione n° 24

Per quanto riguarda l'attuazione dei progetti cui si è avanzata candidatura, non si possono articolare i tempi in quanto essi dipendono dall'approvazione dell'Ente sovraordinato; si rimanda pertanto alla durata dei singoli progetti riportati nelle varie schede di azione.

<b>Modalità di rimodulazione del POA 2003</b>
---

Il criterio di rimodulazione del presente POA 2003 non può essere altro che quello dell'eventuale rifinanziamento, con le somme non utilizzate, delle azioni del POA stesso, tenendo conto della provenienza dei fondi.

In particolare l'esperienza dimostra che spesso a fronte di economie (privati che non spendono l'intera somma assegnata, EE.PP. che non utilizzano i ribassi d'asta, azioni che non registrano la totale attribuzione delle somme disponibili), la soluzione più semplice consiste nella costruzione di graduatorie aperte suddivise in progetti ammissibili e finanziati e progetti ammissibili e non finanziati per carenza di somme.

Ebbene questa modalità si è rilevata vincente in quanto, evitando i pur necessari tempi di valutazione delle modifiche apportate, consente ai primi dei non finanziati di accedere ai co-finanziamenti previsti.

Possono dunque essere rimodulate somme non utilizzate, re-impiegandole in ampliamenti delle azioni relative a ciascun fondo.

La condizione per operare in questo modo è che si arrivi alla definizione delle opere ammesse in un lasso ristretto di tempo, in modo che si possano riassegnare i fondi con una certa rapidità per evitare il dilatarsi dei tempi complessivi di attuazione del Piano, contenuti nel cronoprogramma.

**Attuazione della carta di qualità**

Le modalità di redazione utilizzata nei bandi, le azioni di pubblicità sulle iniziative dell'ente montano, la diffusione delle informazioni attraverso il sito web della Comunità montana e, tra breve anche la possibilità di ricevere informazioni attraverso una news - letter, costituiscono un chiaro segnale di trasparenza che i cittadini residenti dimostrano di apprezzare.

Inoltre l'Agenzia di Sviluppo offre un servizio di consulenza generale (anche on-line) per la realizzazione di opere, sull'avvio verso canali di finanziamento regionali, provinciali e nazionali, nonché per alcuni aspetti procedurali sulla realizzazione degli interventi innescati (in quest'ultimo caso si tratta per lo più di richiami di norme già comprese nei vari strumenti attuativi del Piano), che viene seguito e gradito dal territorio.

Proprio per assecondare la peculiarità del nostro PSSE, che ricordiamo si attua con interventi di privati singoli od associati e di EE.PP. locali (Comuni, Istituzioni Scolastiche, altri Enti) è particolarmente sentita la necessità di migliorare il processo di scambio d'informazioni e di trasparenza nelle operazioni di cofinanziamento.

La nostra **carta della qualità** in questa fase passa dunque per la capitalizzazione dell'esperienza di front-office dell'Agenzia che ci ha portato, grazie anche a suggerimenti ricevuti direttamente dai cittadini per migliorare quelle incomprensioni più frequentemente riscontrate, alla predisposizione di **una nuova versione**, più semplificata della precedente, delle **Norme Tecniche di Attuazione e della modulistica di accompagnamento**, (allegata in calce al presente POA 2003).

Le nuove Norme sono state studiate per poter durare nel tempo e per potersi applicare anche nei prossimi anni; il loro aggiornamento rispetto alla versione predisposta nel 2000 per il V PPI, **costituisce un mezzo per valutare l'impegno dell'Ente verso il territorio** ed il nostro patrimonio di potenziali beneficiari, **convinti che lo sviluppo locale sia un processo unitario da portare avanti in modo integrato tra Amministrazioni Pubbliche e privati**.

Si tratta inoltre di una particolare attenzione al rapporto con i cittadini per istituire, con i fatti, quel processo di crescita civile, di partecipazione alla cosa pubblica e di fattiva partecipazione ai processi di sviluppo locale (si guardi ad esempio al processo di attivazione della Agenda 21) che s'intendono innescare.

Tra le iniziative minori, ma non per questo meno importanti, l'Ente sta costruendo lo strumento del **Forum telematico** -le cui pagine web sono in costruzione ([www.xicomunitamontana.lazio.it](http://www.xicomunitamontana.lazio.it)) e che si prevede di attivare entro il Settembre 2003- anche attraverso la predisposizione di una newsletter e per l'apertura di specifiche aree di discussione e confronto.

17/06/03

Arch. Antonello M. Stefanini  
Dott.ssa Patrizia Di Fazio
